


陕西路桥统计简报

(第6期总期284期)

主办：陕西路桥集团有限公司施工管理部

二〇一三年七月

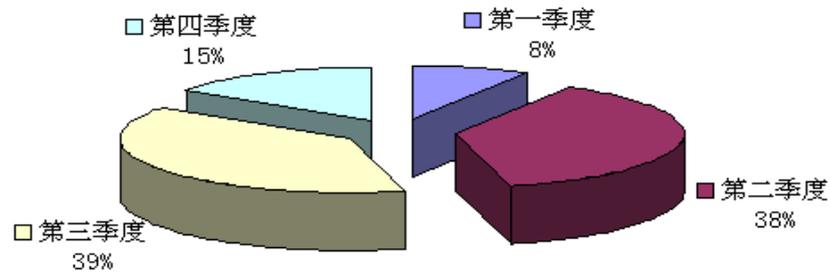

施工计划完成动态图

二〇一三年七月三十一日

2013年7月份计划执行情况分析

一、主要经济指标

截止本月底累计完成施工产值 129292.55 万元，为计划的 53.87%，高于去年同期水平的 14.93%。全员劳动生产率 287317 元/人，高于去年同期水平的 14.39%。第三季度完成计划的 30.52%，本月完成产值 26320.41 万元。

二、主要工程形象进度（累计完成情况）

青海共和至玉树(结古)公路 GYI-SGA4 标

累计完成预制梁 1007/1469 片、矩形板 554/368 片、空心板 182/374 片，分别为合同量的 68.6%、150.5%、48.7%。矩形板安装 498/368 片、梁安装 318/1469 片、空心板安装 24/374，为合同量的 135%、22%、6%。

青海西宁南绕城公路土建工程 9 标隧道工程

累计完成挖方 150/150 km³，为合同量 100%。桩基 34/34 根、墩柱 16/16 根、盖梁 4/12 个，为合同量的 100%、100%、33%。隧道开挖 1569/3230m、支护 1564/3230m、衬砌 1246/3260m，分别为合同量 49%、48%、38%。

青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成土方 391/567 km³、钻孔桩 311/327 根、墩柱 179/222 根、盖梁 42/61 个、梁预制 135/205 片，箱梁安装 75/205 片，为合同量 69%、95%、82%、69%、66%、37%。

青海西宁南绕城公路土建工程 12 标段

累计完成钻孔桩 535/635 根、墩柱 249/435 根、盖梁 67/158 个、梁板 567/1124 片、梁板安装 160/1124 片为合同量 84%、57%、42%、50%、14%。碎石桩 337km、灰土桩 184km、土方 162/1416 km³，为合同量的 154%、35%、11%。

延志吴高速公路路面 LM-3 标

累计完成底基层 204/294 km²、基层 200/285 km²，下面层 188/184 km²、中面层 556/537 km²、上面层 56/579 km²，分别为合同量的 69%、70%、102%、

103%、10%。

延志吴高速公路桥隧路基 LJ-7-1 标

累计完成钻孔桩 12/12 根、墩柱 74/74 根、盖梁 94/94 片,箱梁预制 389/389 片、箱梁安装 542/542 片、T 梁预制安装 24/24 片,分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%、100%。

铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标

累计完成桩基 50/50 根、墩柱 16/16 根、盖梁 8/8 个,为合同量的 100%、100%、100%;全断面掘进 1737/3840m,仰拱填充 1584/3870m,二衬 1451/3870m,分别为合同量的 45%、41%、37%。

铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标

累计完成钻孔桩 553/572 根、墩柱 347/540 根、盖梁 102/274 片、预制梁 320/1380 片、梁安装 100/1380 片,为合同量的 97%、64%、37%、23%、7%。

连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标

累计完成土方 114 km³,为合同量的 71%;水泥搅拌桩 154km,为合同量的 62%;底基层 386/588 km²、级配碎石 34/27km²,分别为合同量的 65%、126%;桩基 170/170 根、墩柱 78/78 根、空心板预制 255/255 片,分别为合同量 100%、100%、100%。

连云港市徐圩新区港前大道工程(GQDD-BT)标段

累计完成土方 583 km³,为合同量的 143%;水泥搅拌桩 142km,为合同量 210%;软土处理钢塑格栅 27km²,为合同量的 111%。底基层 295/454 km²、基层 303/444km²、4cmAC-13 沥青 255/435 km²,分别为合同量的 65%、68%、59%;桩基 120/96 根、墩柱 48/48 根、空心板预制 294/270 片,分别为合同量 125%、100%、110%。排水管道 12/41km,为合同量的 29%。

河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标

累计完成借土土方 1267/1478 km³,为合同量的 86%。钻孔桩 714/714 根、墩柱 469/470 根、盖梁 110/114 片、箱梁预制 495/508 片、安装 421/508 片,分别为合同量的 100%、99%、97%、97%、83%。

三、项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成 26320.41 万元，为计划的 86.55%，其中：

- 1 十天高速公路汉略路面 HL-M04 标完成计划的 115.91%；
- 2 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 101.38%；
- 3 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 100.17%；
- 4 河北京台廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 96.02%；
- 5 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 95.38%；
- 6 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 93.31%；
- 7 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 86.95%；
- 8 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 88.62%；
- 9 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 86.62%；
- 10 江苏连云港徐圩新区港前大道工程完成计划的 84.12%；
- 11 铜黄高速公路路基桥隧 TH-12 标完成计划的 63.31%；
- 12 延志吴高速公路路基 TJ-7-1 标完成计划的 55.36%；
- 13 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 30.28%；
- 14 江苏连云港新海至徐圩新区 XX-2 标完成计划的 18.19%。

四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 62.59%；
- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 40.07%；
- 3 第三工程公司完成计划的 47.07%；
- 4 第四工程公司完成计划的 43.61%；
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 68.66%；
- 6 试验检测中心完成计划的 65.59%；
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 50.86%；
- 8 集团公司合作项目完成计划的 56.61%。

五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 延志吴高速公路路基 TJ7-1 标完成计划的 104.53%；
- 2 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 96.34%；
- 3 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 82.83%；
- 4 铜黄高速公路 TH-20 标完成计划的 74.23%；
- 5 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 74.09%；
- 6 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 62.28%；
- 7 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 51.69%；
- 8 铜黄高速公路 TH-12 标完成计划的 50.96%；
- 9 连云港市徐圩新区 XX-2 标完成计划的 48.52%；
- 10 连云港市徐圩新区港前大道完成计划的 47.71%；

- 11 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 35.56%;
- 12 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 33.38%;
- 13 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 28.64%。

六、存在问题与建议

1. 存在问题:

(1)旬阳 LD 连接线:因原 40 标与业主清算问题未解决,至今冬青桥桩基、冬青隧道未能交接;(2)西咸北环线 LJ-1 标及店塔立交 LJ-N1 标:永久性征地及临时征地等问题业主仍未解决;(3)延安地区的项目受到多年不遇强降雨影响。

2. 建议:

一公司要抓好在建项目的施工进度,确保延志吴 7-1 标按时完工,京台 1 标确保 9 月底基本完工,铜黄 12 标要做好施工计划的调整,补充劳务力量。茶格 1 标、龙永 24 标因前期筹备期长,主体工程进度缓慢。公司要协助项目调整施工计划,加大劳动投入,最大限度的弥补欠产。

二公司要协助西宁 11 标尽快完成上跨铁路施工方案审批,提前做好技术准备、劳务队伍选择、物资设备进场的准备等工作。同时要大力协助青海花九隧道项目前期筹备工作,尽早确定项目方案,缩短筹备期。

三公司要重点协助青海共玉 A4 标施工进度,要加大劳力投入,同时解决箱梁临时存放,合理安排梁板预制、安装及桥面系施工。西宁 9 标隧道要尽快解决洞内通风差问题,同时优化工序,要想方设法解决总体进度滞后问题。同时要大力协助黄延路基 3 标前期筹备工作,尽快开工。

四公司协助做好铜黄 20 标施工现场的扬尘治理,合理控制施工进度,重视质量和安全。要尽快推进马鸣连接线 A6 标、店塔立交、旬阳连接线项目施工。要积极联系业主,尽快解决西咸北环线 LJ-1 标、LJ-8 标征地和地方环境问题,力争尽快进场施工。

路面公司,要重点督促连云港港前大道及徐新路项目施工进度。

七、其他情况说明

- 1 统计资料以项目部提供的为准,统计产值统计截止日期为 7 月 30 日。
- 2 集团公司各部门采用统计数据,请依此数据为准。

2013 年 7 月 31 日

附:各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表

集团公司 2013 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率	本月计划	实际完成	完成比	
工程项目合计		582955.17	245137.87	240000.00	129292.55	53.87%	86250.00	26320.41	30.52%	30412.00	26320.41	86.55%	42.05%
陕西路桥第一工程有限公司		113332.99	57777.81	56634.81	35449.89	62.59%	19976.00	6654.63	33.31%	7924.00	6654.63	83.98%	50.98%
1	京台公路廊坊路基桥隧工程	37365.23	34512.82	18742.00	13759.59	73.42%	6432.00	2532.02	39.37%	2637.00	2532.02	96.02%	92.37%
2	延志吴高速公路 LJ-7 标	12974.44	11774.40	8541.53	7997.51	93.63%	1217.00	672.98	55.30%	1217.00	672.98	55.30%	90.75%
3	铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标段	21268.36	7668.66	14391.44	7668.66	53.29%	5521.00	1228.23	22.25%	1940.00	1228.23	63.31%	36.06%
4	青海茶卡至格尔木预制 CGY21 标	22640.71	2636.76	8386.91	2636.76	31.44%	4724.00	1748.18	37.01%	1600.00	1748.18	109.26%	11.65%
5	龙永高速公路 24 标	19084.25	1185.16	5572.93	1185.16	21.27%	2082.00	473.23	22.73%	530.00	473.23	89.29%	
	待定计划、			1000.00									
	尾留项目施工产值				2202.20								
第二工程公司		113661.51	19179.35	34639.73	13879.94	40.07%	14785.00	3627.26	24.53%	4206.74	3627.26	86.22%	16.87%
1	西宁南绕城公路土建工程 11 标	22034.92	10611.28	10121.42	5553.39	54.87%	4642.00	1300.45	28.01%	1505.00	1300.45	86.41%	48.16%
2	西宝高速咸阳收费站改扩建工程	1990.00	1757.57	1506.10	1386.38	92.05%	224.00	104.28	46.55%	103.00	104.28	101.24%	88.32%
3	西安绕城新筑收费站宿办楼工程	2000.00		500.00									
4	延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标	25162.45	5333.36	15000.00	5333.36	35.56%	6573.00	1860.60	28.31%	1994.00	1860.60	93.31%	21.20%
5	延志吴立交设施 AQ2 标	2013.25	753.13	1828.03	753.13	41.20%	1275.00	200.09	15.69%	408.42	200.09	48.99%	37.41%
6	福银公路咸阳东收费站宿办楼	2580.71	86.21	828.59	86.21	10.40%	185.00			62.30			3.34%
7	佛坪陈三库周交通复建工程 3 标	2712.40	191.84	1324.74	191.84	14.48%	462.00	127.10	27.51%	58.02	127.10	219.06%	
8	青海花九 HD-13 标	54508.39		3200.00			1200.00						
9	勉县收费站改扩建 MX-KJ 合同段	659.39	445.95	330.85	141.58	42.79%	224.00	34.73	15.51%	76.00	34.73	45.70%	67.63%
	尾留产值				434.06								
	佛坪隧道	6021.00	5914.54										98.23%

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣

集团公司 2013 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值 (万元)			第三季度产值 (万元)			月度施工产值 (万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成比率	计划产值	实际完成	完成比率	本月计划	实际完成	完成比	
第三工程公司		93277.22	43084.58	42463.71	19989.38	47.07%	16474.00	4800.69	29.14%	4864.37	4800.69	98.69%	46.19%
1	青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标	21719.39	8017.29	9878.00	4006.09	40.56%	4902.00	1090.76	22.25%	1254.40	1090.76	86.95%	36.91%
2	西宁南绕城公路土建工程 9 标	37800.00	20276.83	13376.00	7522.65	56.24%	3929.00	1386.39	35.29%	1367.54	1386.39	101.38%	53.64%
3	西宁南绕城公路土建工程 12 标	29000.00	12776.90	11618.00	6211.50	53.46%	4643.00	1502.54	32.36%	1500.00	1502.54	100.17%	44.06%
4	神渭管道输煤项目六(1)标段	2928.53	1303.54	2966.00	1303.54	43.95%	947.00	248.11	26.20%	309.43	248.11	80.18%	44.51%
5	田峪河桥	341.20	209.53	341.34	209.53	61.38%	220.00	88.19	40.09%	86.00	88.19	102.55%	61.41%
6	西安 2013 年国省干线危桥改造工程	1174.02	154.48	455.79	154.48	33.89%	339.00	37.69	11.12%	52.00	37.69	72.47%	13.16%
7	陕西交通 2013 年养护工程 QS-5 标	314.08	307.31	358.58	307.31	85.70%	224.00	172.73	77.11%	165.00	172.73	104.68%	97.84%
8	陕西交通 2013 年养护工程 QS-6 标		38.71	270.00	38.71	14.34%	270.00	38.71	14.34%	130.00	38.71	29.77%	
9	黄延高速公路 LJ-3 标段			3200.00			1000.00						
10	十堰至天水高速公路 ACD-27 标段				235.58			235.58			235.58		115.41%
第四工程公司		125103.40	16350.59	31891.00	13908.66	43.61%	10549.00	2991.47	28.36%	3105.92	2991.47	96.32%	13.07%
1	西铜高速公路 TH-20 标	33,468.18	14660.83	18074.54	11400.26	63.07%	4882.00	1707.28	34.97%	1790.00	1707.28	95.38%	43.81%
2	蓝田至周至哑柏公路 A6 标	3604.00	584.99	1800.00	297.54	16.53%	946.00	238.44	25.20%	309.92	238.44	76.94%	16.23%
3	西咸新区北环线路基 LJ-1 标	4227.38		1200.00			340.00						
4	神木石窑大桥	538.81	287.46	578.46	287.46	49.69%	291.00			291.00			53.35%
5	十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标	19,447.00	817.31	5340.00	817.31	15.31%	2392.00			715.00			
6	店塔立交 N1 标	9855.16		2098.00			548.00						
7	西咸新区北环线路基 LJ-8 标	53962.87		2800.00			1150.00						
	尾留产值				1106.10			1045.75			1045.75		

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣


集团公司 2013 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第三季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率	本月计划	实际完成	完成比	
陕西路桥路面工程有限公司		70488.45	53211.41	50846.88	34909.96	68.66%	20376.00	7943.55	38.98%	8980.97	7943.55	88.45%	75.49%
1	连云港徐圩新区港前大道工程建设	29047.27	22085.31	11700.22	6383.60	54.56%	4270.00	1658.05	38.83%	1971.00	1658.05	84.12%	76.03%
2	新海至徐圩新区 XX-2 标	15406.18	8678.27	9737.87	4691.66	48.18%	4770.00	425.81	8.93%	2341.51	425.81	18.19%	56.33%
3	延志吴高速公路 LM-3 标段	12208.00	11890.02	12056.17	8372.14	69.44%	3904.00	1136.08	29.10%	1282.00	1136.08	88.62%	97.40%
4	连云港其他项目	552.05	552.05	552.05	552.05	100.00%							100.00%
5	十天高速公路陕西汉略 HL-M04 标	9075.29	5937.32	9955.93	5937.32	59.64%	4187.00	1954.80	46.69%	1686.46	1954.80	115.91%	65.42%
6	西长 2013 年公路养护工程 DL-4 标	1168.00	25.04	25.04	25.04	99.99%							2.14%
7	西镇 2013 年公路养护工程 DL-6 标	93.93	98.93	98.93	98.93	100.00%							105.33%
8	蒙靖 2013 年公路养护工程 DL-2 标	2937.73	3493.30	3969.51	3493.30	88.00%	3245.00	2317.63	71.42%	1700.00	2317.63	136.33%	118.91%
9	蓝商 2013 年公路养护工程 DL-8 标		451.16	451.16	451.16	100.00%		451.16			451.16		
10	西宝改扩建工程			500.00									
11	尾留产值				4904.75								
12	待定计划			1800.00									
试验检测中心				360.00	236.14	65.59%	90.00			30.00			
兴通监理公司				2850.00	1449.37	50.86%	1000.00			300.00			
二、集团公司合作项目		67091.60	55534.14	11929.00	6195.36	51.94%	3000.00	302.81	10.09%	1000.00	302.81	30.28%	82.77%
1	延延高速公路路基 LI-1 标	9736.00	2004.56	7000.00	2004.56	28.64%	3000.00	302.81	10.09%	1000.00	302.81	30.28%	20.59%
2	省道 303 线二级公路长米段土建工程	3733.00	3245.37	400.00									86.94%
3	梅大高速公路土建工程 4 标段	28748.45	25839.02	3370.00	3370.69	100.02%							89.88%
4	粤湘高速博深段第 8 标段	24874.15	24445.19	1159.00	820.11	70.76%							98.28%
三、集团公司尾留项目				11594.87	3273.85								

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣


2013年重点项目生产计划完成情况图表

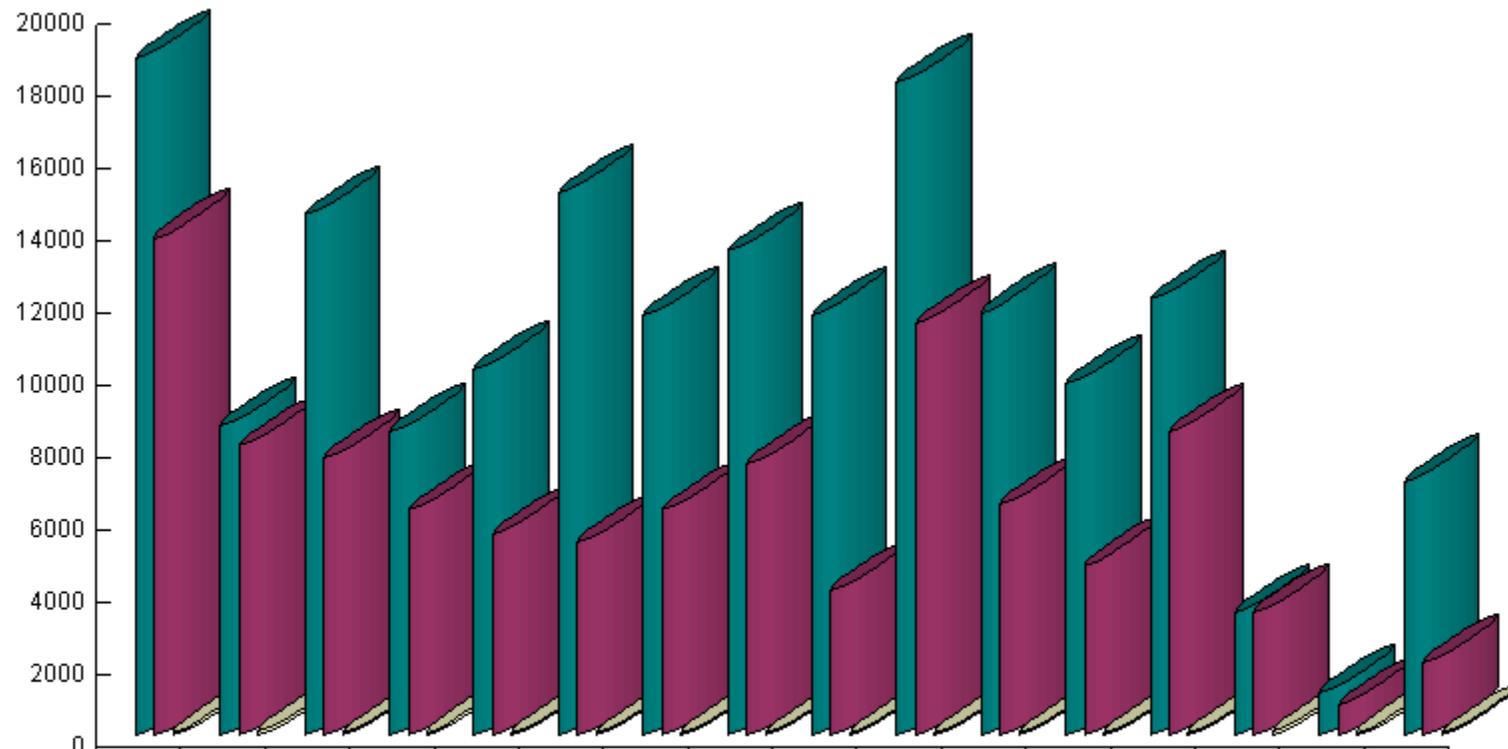

	廊坊梁基 桥隧工程	冠华吴公 路7标段	铜黄公路 C12标段	青商茶楼 CGYZ1 标	西宁绕城 公路11标	冠冠高速 公路6标	西宁绕城 公路12标	西宁绕城 公路9标	共五公路 GYI- SGA4标	铜黄公路 C20标段	桂云路徐 坪新区地 前大道	新商至徐 坪新区 XX-2标	冠华吴高 速LMB标	梅大公路 工程4标	粤湘高速 陈深8标	冠冠高速 公路1标
■ 计划数据	18742	8542	14391	8387	10121	15000	11618	13376	11618	18075	11700	9738	12056	3370	1159	7000
■ 实际完成	13760	7998	7669	6212	5553	5333	6212	7523	4006	11400	6384	4692	8372	3371	820	2005
□ 计划完成率%	73	94	53	74	55	36	53	56	34	63	55	48	69	100	71	29

■ 计划数据 ■ 实际完成 □ 计划完成率%

2013年重点项目合同履行统计图表

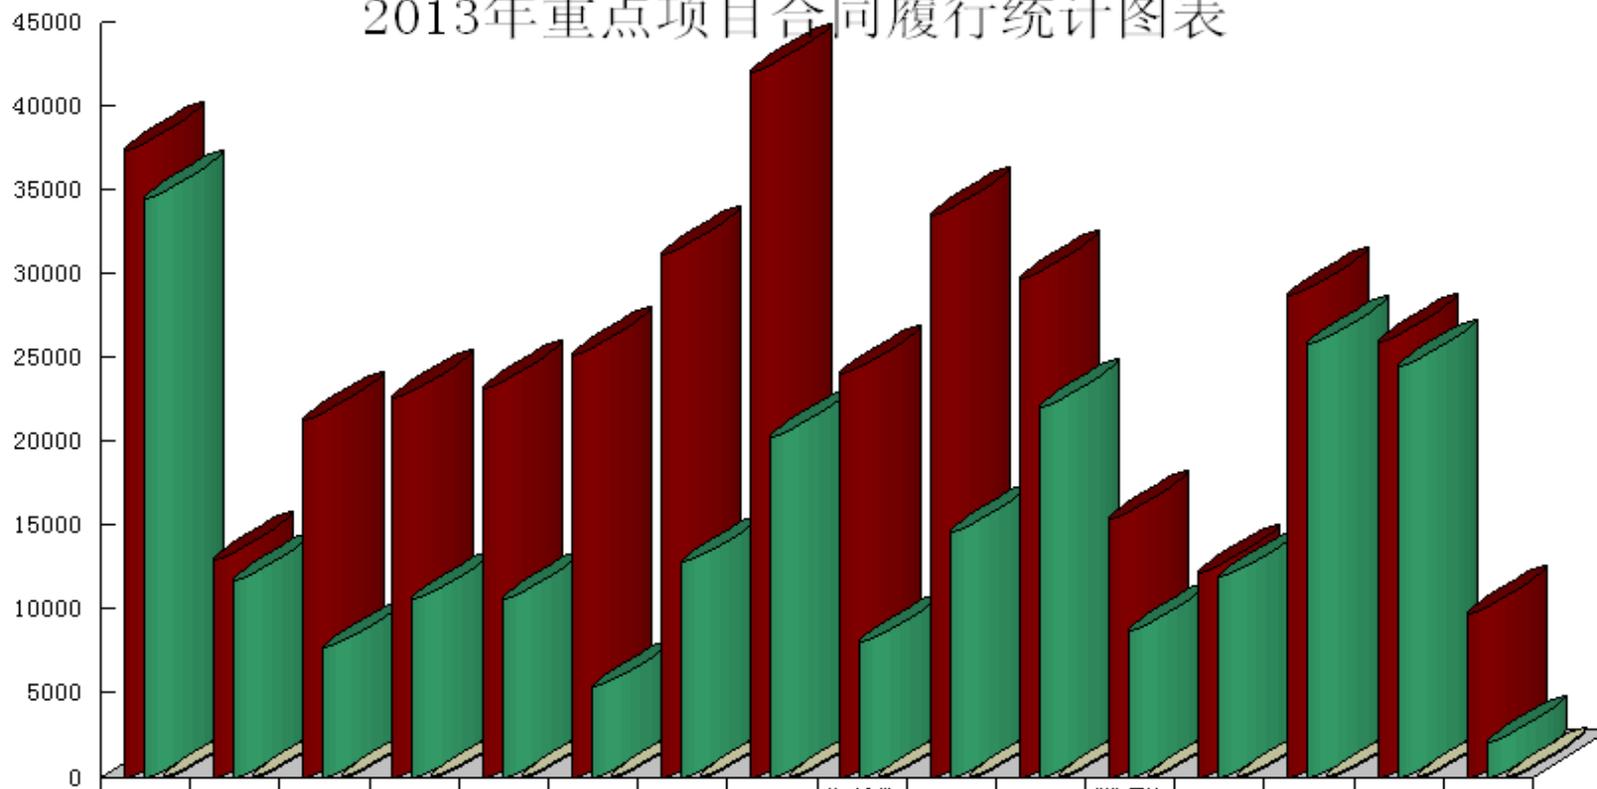

	廊坊枢纽 桥隧工程	冠亭吴公 路7标段	铜黄公路 C12标段	青商茶格 CGYZ1标	西宁绕城 公路11标	冠冠高速 公路6标	西宁绕城 公路12标	西宁绕城 公路9标	共玉公路 GYL- SGA4标	铜黄公路 C20标段	连云港徐 圩新区建 前大道	新南至徐 圩新区 XX-2标	冠亭吴高 速LMB标	梅大公路 工程4标	乌塘高速 博深8标	冠冠高速 公路1标
■ 合同总额	37365	12974	21268	22641	23167	25162	31195	42089	24059	33468	29748	15406	12208	28748	25963	9736
■ 累计完成数量	34513	11774	7669	10611	10611	5333	12777	20277	8017	14661	22085	8678	11890	25839	24445	2005
□ 计划完成率%	92	91	36	47	46	21	41	48	33	44	74	56	97	90	94	21

■ 合同总额 ■ 累计完成数量 □ 计划完成率%

部门负责人：杨武策

统计报告人：朱建荣
