


陕西路桥统计简报

(第 4 期总第 293 期)

主办：陕西路桥集团有限公司施工管理部

二〇一四年五月

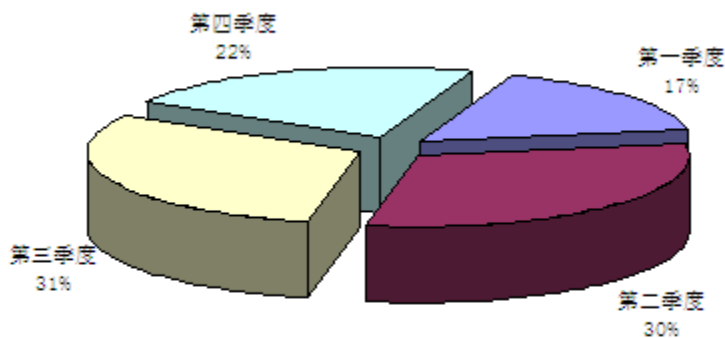

施工计划完成动态图

二〇一四年六月四日

2014 年 5 月份计划执行情况分析

一、主要经济指标

截止本月底累计完成产值 117186.63 万元，为年计划的 38.69%，全员劳动生产率 213067 元/人，分别高于去年同期水平 71.49%、40.36%。本月完成产值 34000.14 万元。累计承接 3 个项目总额 9.77 亿元，为年计划的 27.91%（承接项目以移交资料为准）。

试验检测中心完成服务产值 217.82 万元，为年计划的 60.51%；兴通监理公司完成服务产值 892.07 万元，为年计划的 27.88%，新承接任务 1648.56 万元，为年计划 63.41%。

二、主要工程形象进度（累计完成情况）

青海省茶格至格尔木公路工程 CGYZ-1 标段

累计完成预制：20m 箱梁 1155/1710 片、30m 箱梁 89/131 片、16m 空心板 1185/1780 片、8m 矩形板 1604/1604 片、涵洞盖板 16971/16971 片；分别为合同的 68%、68%、67%、100%、100%。

青海共和至玉树(结古)公路 GYI-SGA4 标

累计完成预制梁 1428/1469 片、矩形板 616/368 片、空心板 316/374 片，分别为合同量的 97%、167%、84%。矩形板安装 524/368 片、梁安装 1103/1469 片、空心板安装 215/374，为合同量的 142%、75%、57%。

青海西宁南绕城公路土建工程 9 标隧道工程

累计完成挖方 150/150 km³，为合同量 100%。桩基 34/34 根、墩柱 16/16 根、盖梁 12/12 个，为合同量的 100%、100%、100%。隧道开挖 3000/3230m、支护 2995/3230m、衬砌 2878/3260m，分别为合同量 93%、93%、88%。

青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成土方 620/567 km³、钻孔桩 345/345 根、墩柱 258/258 根、盖梁 62/62 个、梁预制 205/205 片，箱梁安装 205/205 片，现浇箱梁 11 联，悬臂

浇筑 22/104 块,为合同量 109%、100%、100%、100%、100%、100%、78%、21%。

青海西宁南绕城公路土建工程 12 标

累计完成碎石桩 337km、灰土桩 195km、土方 778 km³,分别为合同量的 100%、87%、56%。钻孔桩 737/758 根、墩柱 556/620 根、盖梁 204/268 个、梁板 1107/1250 片、梁板安装 780/1250 片、现浇箱梁 34/55 孔,为合同量 97%、90%、76%、89%、62%、62%。

青海省花石峡至久治公路 HD13 标段

累计完成洞身开挖 339/3790m、初期支护 339/3790m、二衬 72/3790m,为合同量 9%、9%、2%。

连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标

累计完成土方 142 km³,为合同量的 78%;水泥搅拌桩 154km,为合同量的 62%;底基层 488/588 km²、级配碎石 34/27km²、面层 192/270 km²;分别为合同量的 83%、128%、71%;桩基 170/170 根、墩柱 78/78 根、空心板预制 255/255 片,分别为合同量 100%、100%、100%。

河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标

累计完成借土填方 1646/1580 km³,为合同量的 104%。钻孔桩 714/714 根、墩柱 470/470 根、盖梁 114/114 个、箱梁预制 508/508 片、安装 508/508 片,分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%。

黄延高速公路扩能工程 LJ-3 标

累计完成挖方 125/122 km³,为合同量的 102%;钻孔桩 99/99 根、墩柱 36/72 根、盖梁 15/31 个,分别为合同量的 100%、50%、48%;全断面掘进 1344/4197m、支护 1344/4197m、衬砌 617/4328m,分别为合同量 32%、32%、14%。

铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标

累计完成桩基 50/50 根、墩柱 16/16 根、盖梁 8/8 个,梁板预制 74/74 片,为合同量的 100%、100%、100%、100%;全断面掘进 3304/3863m,仰拱填

充 3425/3924m, 二衬 3118/3924m, 分别为合同量的 85%、87%、79%。

铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标

累计完成钻孔桩 568/568 根、墩柱 536/536 根、盖梁 272/272 个、预制梁 1153/1380 片、梁安装 1065/1380 片, 为合同量的 100%、96%、98%、84%、77%。

延延高速公路路基 LJ-1 标

累计完成土方 537/580 km^3 ; 分别为合同量的 93%。桩基础 196/196 根、墩柱 115/115 根、盖梁 91/91 个、空心板预制 284/284 片、空心板安装 284/284 片、箱梁预制 247/247 片、箱梁安装 247/247 片, 分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%、100%。

西宝高速公路改扩建路面 B-M07 标

累计完成水泥稳定碎石底基层 62/377 km^2 、水泥稳定碎石基层 48/527 km^2 , 分别为合同量的 16%、9%。粗粒式密级配沥青混凝土 15/418 km^2 、中粒式沥青混凝土 15/726 km^2 , 为合同量的 3%、2%。

咸旬高速公路路面 LM-1 标

累计完成石灰粉煤灰稳定碎石底基层 574/951 km^2 、水泥稳定碎石基层 678/954 km^2 、粗粒式密级配沥青碎石 406/672 km^2 、中粒式改性沥青混凝土 58/969 km^2 , 分别为合同量的 60%、71%、60%、6%。

西咸北环线路基 LJ-8 标

累计完成强夯 463/528 km^2 、灰土、碎石桩 697/1215 km , 分别为合同量的 94%、57%; 桥梁基础桩 547/813 根、墩柱 116/466 根、盖梁 72/240 个、梁板预制 351/859 片、安装 71/859 片, 分别为合同量的 67%、25%、30%、41%、8%。

十天高速公路旬阳 LD 连接线 AD-LD 标

累计完成桥梁基础桩 303/326 根、墩柱 218/284 根、盖梁 119/159 个、箱梁预制 308/483 片、箱梁安装 270/483 片, 分别为合同量的 93%、77%、75%、64%、55%。隧道工程已经开始施工, 完成合同量的 2%。

渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标

累计完成土方 575/1322 km³，为合同量的 43%。桥梁桩基 179/416 根、墩柱 18/260 根、盖梁 6/169 个、箱梁预制 159/532 片、安装 5/532 片，分别为合同总量 43%、7%、7%、3%、30%、1%。

河南省道 250 线灵宝至朱阳段改建工程 S250SG-2 标

累计完成桥梁桩基 32/42 根，薄壁墩 3/6 根，盖梁 1/15 个，分别为合同量的 76%、50%、7%；隧道开挖 220/606m、初期支护 91/606m，分别为合同总量 36%、15%。

湖南龙永高速公路 24 标

累计完成隧道开挖 2185/4488m、初期支护 2185/4488m、二次衬砌 1673/4488m，分别为合同总量 49%、49%、37%。

三、重点项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成产值 34000.14 万元，为计划的 97.27%，其中：

- 1 青海茶格高速公路 CGYZ-1 标完成计划的 119.66%；
- 2 湖南龙永高速公路 24 标完成计划的 118.67%；
- 3 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 118.09%；
- 4 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 116.42%；
- 5 十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标完成计划的 114.38%；
- 6 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标完成计划的 111.39%；
- 7 西咸新区北环线路基 LJ-8 标完成计划的 108.36%；
- 8 青海省花石峡至久治公路 HD13 标完成计划的 104.98%；
- 9 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 97.66%；
- 10 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 95.50%；
- 11 铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标完成计划的 87.80%；
- 12 渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标完成计划的 74.40%；
- 13 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-22 标完成计划的 68.36%；
- 14 延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标完成计划的 63.31%；
- 15 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 50.64%；

16 咸旬高速公路路面 LM-1 标完成计划的 53.54%。

四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 28.07%;
- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 33.12%;
- 3 第三工程公司完成计划的 45.58%;
- 4 第四工程公司完成计划的 48.73%;
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 21.77%;
- 6 试验检测中心完成计划的 60.51%;
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 27.88%。

五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 72.62%;
- 2 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 59.97%;
- 3 青海茶格高速公路 CGYZ-1 标完成计划的 55.85%;
- 4 湖南龙永高速公路 24 标完成计划的 52.14%;
- 5 西咸新区北环线路基 LJ-8 标完成计划的 45.65%;
- 6 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 45.27%;
- 7 铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标完成计划的 44.02%;
- 8 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标段完成计划的 43.56%;
- 9 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 41.28%;
- 10 咸旬高速公路路面 LM-1 标完成计划的 39.07%;
- 11 青海省花石峡至久治公路 HD13 标完成计划的 33.25%;
- 12 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 31.40%;
- 13 渭玉高速公路路基桥隧工程 WY-03 标完成计划的 30.76%;
- 14 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-22 标段完成计划的 15.78%。

六、简要分析与建议:

1.分析:

本月完成计划产值的 97.27%，总体情况一般。5 月份省外项目 9 个，除京台 LQ1 标、共玉 4 标、西宁绕城 9 标、河南省 250 线改建工程 SG-2 标等

项目外,其余基本完成月度计划任务;省内项目15个,除黄延扩能项目LJ-3标、西咸北环线LJ-8标、铜黄TH-20标、安康连接线AD标等4个项目完成计划任务外,其余的11个项目未能完成月度计划。

2、存在问题:

①、受气候影响项目有:青海共玉4标受到草原返绿推迟,风雪天气仍不间断,缺氧仍较为严重;省内的项目也普遍受到雨水的影响。

②、今年新开项目受到施工环境的影响。主要表现征地拆迁工作不到位,红线内征地滞后工作面有限,严重影响施工进度。

③、施工缓慢。施工受到环境影响比较大。

④、施工现场管理不到位。表现为计划执行力差。

2.建议:

各项目认真分解月度计划目标,目标层层落实,责任到人,并制定详细的计划实施措施,各项资源到位;加强施工现场管理和内部管控,在保证施工安全的前提下,合理安排进度,抓住可施工的时间,极大的提高生产效率和工作效率,加大组织协调力度,确保各项目的阶段目标实施;提前摸排影响施工进度的外界及社会环境的因素,加强各方沟通联系,避免阻工影响进度。特别今年要交验的项目,根据项目合同要求,倒排计划,确保项目按时完工和总体计划实施。

七、其他情况说明

1 统计资料以项目部提供的为准,统计产值统计截止日期为5月30日。

2 集团公司各部门采用统计数据,请依此数据为准。

2014年6月4日

附:各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表


集团公司 2014 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值（万元）			第二季度产值（万元）			月度施工产值（万元）			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成比率	计划产值	实际完成	完成比率	本月计划	实际完成	完成比率	
陕西路桥集团有限公司合计		1375209.90	1141276.39	302905.00	117186.63	38.69%	105667.00	65621.26	62.10%	34955.68	34000.14	97.27%	82.99%
陕西路桥第一工程有限公司		104339.41	85216.77	54216.00	15221.14	28.07%	17019.00	11291.16	66.34%	6653.00	5448.34	81.89%	81.67%
1	京台公路廊坊路基桥隧工程 LQ1	45482.00	44707.18	2294.00	1519.10	66.22%	1480.00	1106.64	74.77%	849.00	324.11	38.18%	98.30%
2	铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标段	21412.00	16377.29	6023.00	2651.22	44.02%	4197.00	2424.18	57.76%	1354.00	1188.83	87.80%	76.49%
3	青海茶卡至格尔木预制 CGYZ1 标	20067.00	15773.97	9723.00	5429.71	55.84%	5497.00	5137.98	93.47%	1950.00	2333.36	119.66%	78.61%
4	龙永高速公路 24 标	17378.41	8358.33	7376.00	3845.62	52.14%	2445.00	2622.36	107.25%	1350.00	1602.04	118.67%	48.10%
	待定计划			26000.00			3000.00			1000.00			
	以子公司名义承揽项目			2800.00			400.00			150.00			
	尾留项目产值	134032.28	140978.52		1775.49								
陕西路桥第二工程有限公司		166092.32	51835.46	58250.00	19292.67	33.12%	25477.00	13315.21	52.26%	9091.76	7466.60	82.12%	31.21%
1	西宁南绕城公路土建工程 11 标	19800.00	17357.39	4462.00	2019.84	45.27%	2039.00	1485.87	72.87%	737.64	813.34	110.26%	87.66%
2	延延高速公路桥涵工程 LJ-6 标	25291.45	20449.19	9672.00	5119.31	52.93%	7015.00	3589.39	51.17%	2638.69	1670.56	63.31%	80.85%
3	佛坪县陈三库周交通复建工程 3	2636.77	1868.93	1005.00	1223.03	121.69%	1304.00	564.42	43.28%	473.85	338.03	71.34%	70.88%
4	青海花九 HD-13 标	42000.00	4918.28	11300.00	3757.50	33.25%	3677.00	2525.92	68.70%	1217.45	1278.09	104.98%	11.71%
5	榆林收费站北迁工程 SJ-TJ-2 标	3153.58	381.75	1804.00	381.75	21.16%	633.00	349.18	55.16%	248.12	284.06	114.48%	12.11%
6	S250 线灵朱段改建工程 SG-2 标	6494.40	1917.97	4202.00	1849.29	44.01%	2786.00	1112.63	39.94%	981.51	706.08	71.94%	29.53%
7	零口至马召一级公路改建工程 I	10648.14	1821.78	5031.00	1821.78	36.21%	2512.00	1629.63	64.87%	940.00	1108.64	117.94%	17.11%
8	黄延公路改扩能路基桥隧 22 标	52067.98	3120.17	19774.00	3120.17	15.78%	5511.00	2058.17	37.35%	1854.50	1267.80	68.36%	5.99%
	以子公司名义承揽项目	4000.00		1000.00									
	尾留项目产值	74605.14	79755.81										
第三工程公司		197407.71	90329.47	54882.00	25012.96	45.58%	19060.00	15854.31	83.18%	8461.92	8496.36	100.41%	45.76%
1	青海共和至玉树公路 GYI-SGA4 标	16516.92	12924.12	5237.00	1644.58	31.40%	4047.00	1418.37	35.05%	1574.41	797.29	50.64%	78.25%
2	西宁南绕城公路土建工程 9 标	39318.64	35028.83	10280.00	6164.73	59.97%	3710.00	2694.80	72.64%	1337.51	1277.26	95.50%	89.09%
3	西宁南绕城公路土建工程 12 标	35007.86	27105.63	11255.00	4646.48	41.28%	4379.00	4143.90	94.63%	2100.00	2479.86	118.09%	77.43%
4	黄延公路扩能路基桥隧工程 LJ3 标	57750.88	15270.89	28110.00	12244.44	43.56%	6819.00	7447.31	109.21%	3450.00	3842.84	111.39%	26.44%
	尾留项目产值	43157.65	40889.81		312.73		105.00	149.93	142.79%		99.11		

集团公司 2014 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值（万元）			第二季度产值（万元）			月度施工产值（万元）			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成率	计划产值	实际完成	完成率	本月计划	实际完成	完成率	
第四工程公司		138025.74	137382.80	55010.00	26808.52	48.73%	18391.00	15207.97	82.69%	7615.00	7444.91	97.77%	99.53%
1	西咸新区北环线路基 LJ-1 标	3644.20	1954.40	3216.00	1538.85	47.85%	1584.00	837.61	52.88%	853.00	476.69	55.88%	53.63%
2	西咸新区北环线路基 LJ-8 标	54278.38	14526.24	26100.00	11915.42	45.65%	7578.00	7240.20	95.54%	2800.00	3033.99	108.36%	26.76%
3	渭玉高速公路路基桥隧工程 3 标	16958.00	3110.84	10114.00	3110.84	30.76%	4130.00	1663.84	40.29%	1413.00	1051.21	74.40%	18.34%
4	十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标	19712.26	7944.45	8000.00	2460.64	30.76%	3002.00	1547.02	51.53%	760.00	869.29	114.38%	40.30%
5	西铜高速公路 TH-20 标	33577.74	29603.17	7580.00	5504.23	72.62%	2097.00	3406.19	162.43%	1289.00	1500.62	116.42%	88.16%
6	西延分公司养护中修工程	189.38	189.38		189.38								
	尾留项目产值	57941.63	75774.86		2089.16			513.11		500.00	513.11	102.62%	
陕西路桥路面工程有限公司		62815.53	13138.57	65000.00	14149.22	21.77%	24525.00	6806.64	27.75%	8303.00	3181.07	38.31%	20.92%
1	咸旬高速公路路面 LM-1 标	21612.73	10619.35	17900.00	6992.92	39.07%	11471.00	5053.45	44.05%	4689.00	2510.47	53.54%	49.13%
2	西宝改扩建工程	15302.80	1647.19	8110.00	873.78	10.77%	3206.00	810.98	25.30%	494.00	590.67	119.57%	10.76%
3	延延高速公路路基 LM-1 标	25900.00	392.76	8165.00	392.76	4.81%	1308.00	79.93	6.11%	400.00	79.93	19.98%	1.52%
	待定计划			30825.00	479.27	1.55%	8540.00	479.27		2500.00			
	汉中嘉陵江大桥改建配套渡河工程		479.27		479.27								
	尾留产值	307968.75	340007.64		5410.49			383.01		220.00			
二、集团公司合作项目		88823.74	85966.68	11987.00	15592.23	130.08%		3145.97			1962.86		96.78%
1	延延高速公路路基 LI-1 标	9736.00	7402.06	7000.00	7402.06	105.74%		2459.10			1962.86		76.03%
2	省 303 线二级公路长米段土建工程	3733.00	4180.00	935.00	934.63	99.96%							111.97%
3	梅大高速公路土建工程 4 标段	28748.45	27389.49	3232.00	4921.16	152.26%							95.27%
4	粤湘高速博深段第 8 标段	24874.15	24445.19	820.00	820.11	100.01%							98.28%
5	大广公路龙杨段路基路面工程 2 标	13444.10	14035.66		827.40								104.40%
6	郑洛高速公路改扩建路面第 6 标段	8288.04	8514.28		686.87			686.87					102.73%
试验检测中心				360.00	217.82	60.51%	90.00						
兴通监理公司				3200.00	892.07	27.88%	1000.00						

2014年重点项目生产计划完成情况图表

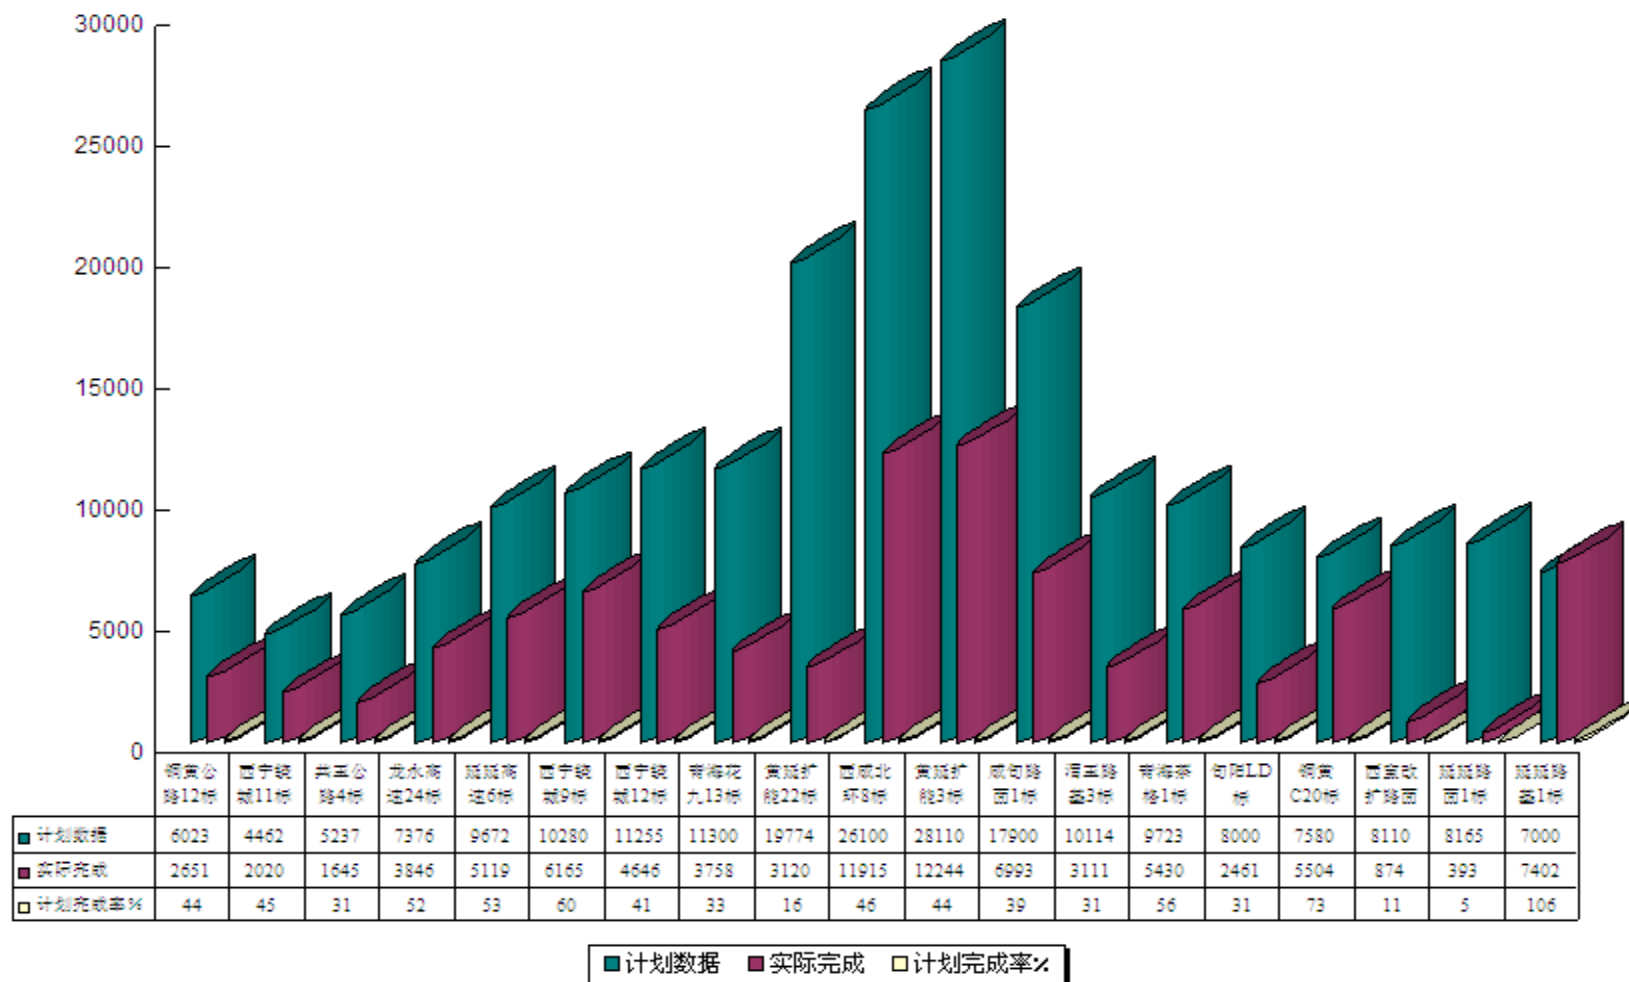

2014年重点项目合同履行统计图表

