


陕西路桥统计简报

(第11期总期289期)

主办：陕西路桥集团有限公司施工管理部

二〇一三年十二月

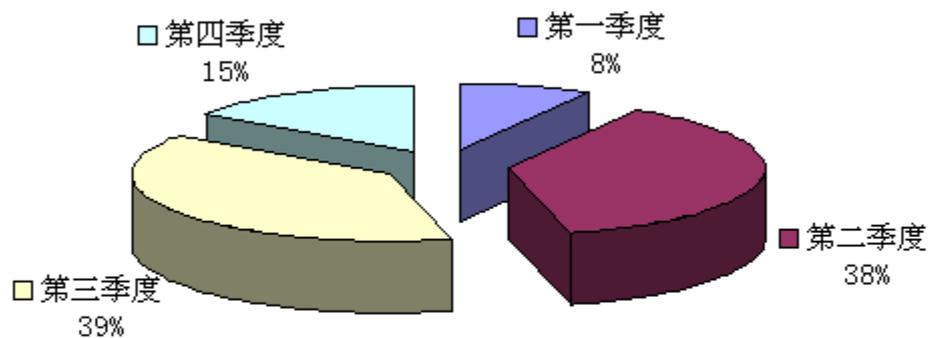

二〇一四年一月五日

2013年12月份计划执行情况分析

一、主要经济指标

截止本月底累计完成施工产值 246855.62 万元，为计划的 102.86%，高于去年同期水平的 12.60%。全员劳动生产率 536642 元/人，高于去年同期水平的 12.60%。第四季度完成计划的 110.50%，本月完成产值 11176.23 万元。

截止 12 月 25 日承接新项目 36.42 亿，为计划的 145.68%。兴通监理公司完成 3627.15 万元，为计划 127.27%。试验检测中心完成产值 441.53 万元，为计划 122.50%。

二、主要工程形象进度（累计完成情况）

青海共和至玉树(结古)公路 GYI-SGA4 标

累计完成预制梁 1257/1469 片、矩形板 554/368 片、空心板 294/374 片，分别为合同量的 86%、150%、77%。矩形板安装 514/368 片、梁安装 743/1469 片、空心板安装 150/374，为合同量的 139%、50.6%、40%。

青海西宁南绕城公路土建工程 9 标隧道工程

累计完成挖方 150/150 km³，为合同量 100%。桩基 34/34 根、墩柱 16/16 根、盖梁 4/12 个，为合同量的 100%、100%、33%。隧道开挖 2360/3230m、支护 2355/3230m、衬砌 2094/3260m，分别为合同量 73%、73%、64%。

青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段

累计完成土方 586/567 km³、钻孔桩 351/327 根、墩柱 258/222 根、盖梁 61/61 个、梁预制 205/205 片，箱梁安装 205/205 片，现浇箱梁 7 联，为合同量 103%、107%、118%、100%、100%、76%、50%。

青海西宁南绕城公路土建工程 12 标段

累计完成碎石桩 337km、灰土桩 184km、土方 545 km³，为合同量的 100%、82%、39%。钻孔桩 699/758 根、墩柱 475/620 根、盖梁 166/268 个、梁板 931/1250 片、梁板安装 540/1250 片，为合同量 92%、77%、62%、74%、43%。

延志吴高速公路路面 LM-3 标

累计完成底基层 204/294 km²、基层 200/285 km²，下面层 188/184 km²、中面层 581/537 km²、上面层 585/579 km²，分别为合同量的 69%、70%、102%、108%、101%。

延志吴高速公路桥隧路基 LJ-7-1 标

累计完成钻孔桩 12/12 根、墩柱 74/74 根、盖梁 94/94 片，箱梁预制 389/389 片、箱梁安装 542/542 片、T 梁预制安装 24/24 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%、100%。

铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标

累计完成桩基 50/50 根、墩柱 16/16 根、盖梁 8/8 个，梁板预制 74/74 片，为合同量的 100%、100%、100%、100%；全断面掘进 2813/3840m，仰拱填充 2764/3870m，二衬 2644/3870m，分别为合同量的 73%、71%、68%。

铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标

累计完成钻孔桩 568/568 根、墩柱 510/540 根、盖梁 258/274 片、预制梁 880/1380 片、梁安装 800/1380 片，为合同量的 100%、94%、94%、64%、58%。

连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标

累计完成土方 142 km³，为合同量的 78%；水泥搅拌桩 154km，为合同量的 62%；底基层 488/588 km²、级配碎石 34/27km²、面层 192/270 km²；分别为合同量的 83%、128%、71%；桩基 170/170 根、墩柱 78/78 根、空心板预制 255/255 片，分别为合同量 100%、100%、100%。

连云港市徐圩新区港前大道工程(GQDD-BT)标段

累计完成土方 683km³，为合同量的 167%；水泥搅拌桩 142km，为合同量 210%；软土处理钢塑格栅 34km²，为合同量的 136%。底基层 478/454 km²、基层 332/444km²、4cmAC-13 沥青 260/435 km²，分别为合同量的 105%、74%、60%；桩基 120/96 根、墩柱 48/48 根、空心板预制 294/270 片，分别为合同量 125%、100%、110%。排水管道 21/41km，为合同量的 51%。

河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标

累计完成借土土方 1486/1580 km³，为合同量的 94%。钻孔桩 714/714 根、墩柱 470/470 根、盖梁 114/114 片、箱梁预制 508/508 片、安装 508/508 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%。

三、重点项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列）

本月实际完成 11176.23 万元，为计划的 109.82%，其中：

- 1 湖南龙永高速公路路基 24 标完成计划的 172.19%；
- 2 铜黄高速公路路基桥隧 TH-12 标完成计划的 169.17%；
- 3 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标段完成计划的 123.19%；
- 4 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 112.97%；
- 5 十天高速公路旬阳连接线 AD-LD 标完成计划的 108.89%；
- 6 江苏连云港徐圩新区港前大道工程完成计划的 106.94%；
- 7 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 106.42%；
- 8 西宝改扩公路工程为完成计划的 103.88%；
- 9 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 100.17%；
- 10 咸旬高速公路路面 LM1 标完成计划的 97.85%；
- 11 江苏连云港新海至徐圩新区 XX-2 标完成计划的 96.28%；

四、各工程公司的年计划执行情况

- 1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 110.45%；
- 2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 100.56%；
- 3 第三工程公司完成计划的 112.83%；
- 4 第四工程公司完成计划的 117.74%；
- 5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 107.74%；
- 6 试验检测中心完成计划的 122.50%；
- 7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 99.81%；

五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列）

- 1 延志吴高速公路路基 TJ7-1 标完成计划的 123.63%；
- 2 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 121.16%；
- 3 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 114.73%；

- 4 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 113.3%;
- 5 连云港市徐圩新区港前大道完成计划的 112.22%;
- 6 铜黄高速公路 TH-20 标完成计划的 112.09%;
- 7 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 111.16%;
- 8 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 102.20%;
- 9 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 101.58%;
- 10 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 100.05%;
- 11 铜黄高速公路 TH-12 标完成计划的 100.93%;
- 12 连云港市徐圩新区 XX-2 标完成计划的 97.22%;

六、简要分析与建议:

1.分析:

本月计划基本完成。

2.建议:

各单位根据项目 2014 年计划安排,提前做好各项目计划分解,同时做好计划的各项保证措施,确保 2014 年计划实施。

七、其他情况说明

- 1 统计资料以项目部提供的为准,统计产值统计截止日期为 12 月 31 日。
- 2 集团公司各部门采用统计数据,请依此数据为准。

2014 年 1 月 5 日

附:各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表

集团公司 2013 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第四季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
工程项目合计		674503.95	361138.07	240000.00	246855.62	102.86%	50133.88	55398.31	110.50%	10176.23	11176.23	109.82%	53.54%
陕西路桥第一工程有限公司		110213.04	86798.26	59200.00	65386.16	110.45%	8292.91	14425.02	173.94%	790.00	5858.88		78.75%
1	京台公路廊坊路基桥隧工程 LQ1 标	35951.12	43188.07	19800.00	22434.85	113.31%	1470.21	4105.06	279.22%		1491.36		120.13%
2	延志吴高速公路 LJ-7 标	12974.44	15027.15	9100.00	11250.26	123.63%		2098.41			2098.40		115.82%
3	铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标段	21268.36	13726.07	13600.00	13726.07	100.93%	2591.66	2717.73	104.86%	230.68	390.24	169.17%	64.54%
4	青海茶卡至格尔木预制 CGYZ1 标	22640.71	10344.26	10300.00	10344.26	100.43%	2021.72	2065.98	102.19%				45.69%
5	龙永高速公路 24 标	17378.41	4512.71	4200.00	4512.71	107.45%	2209.32	2522.03	114.15%	559.32	963.07	172.19%	25.97%
6	十堰至天水高速公路汉中段 H-C21 标	34604.46	36106.49	1502.00	1502.00	100.00%							104.34%
7	青兰公路陕西段高速公路第 LJ20 标	19249.17	20232.97		983.80						983.80		105.11%
8	十天公路陕西段高速公路 A-C10 标	38683.41	39315.62	700.20	632.21	90.29%					-67.99		101.63%
陕西路桥第二工程有限公司		113661.51	38351.03	32868.00	33051.62	100.56%	8031.78	8145.64	101.42%		68.68		33.74%
1	西宁南绕城公路土建工程 11 标	22034.92	15337.55	10120.00	10279.65	101.58%	1418.45	1578.10	111.26%				69.61%
2	西宝高速咸阳收费站改扩建工程	1990.00	1993.00	1621.00	1621.81	100.05%							100.15%
3	西安绕城新筑收费站宿办楼工程	2000.00	742.70	500.00	742.70	148.54%	184.60	427.30	231.47%				37.14%
4	延延高速路基桥涵工程 LJ-6 标	25162.45	15329.88	15000.00	15329.88	102.20%	4485.28	4815.16	107.35%				60.92%
5	延志吴交安设施 AQ2 标	2013.25	1830.50	1830.00	1830.50	100.03%	75.76	76.26	100.66%				90.92%
6	福银公路咸阳东收费站宿办楼	2580.71	582.44	325.00	582.44	179.21%	238.79	496.23	207.81%				22.57%
7	佛坪县陈三库周交通复建工程 3 标	2712.40	645.91	1083.00	645.91	59.64%	626.67	189.58	30.25%				23.81%
8	青海花九 HD-13 标	54508.39	1160.78	1200.00	1160.78	96.73%	602.23	563.01	93.49%				2.13%
9	S250 线灵朱段改建工程 SG-2 标		68.68		68.68						68.68		
10	勉县收费站改扩建 MX-KJ 合同段	659.39	659.59	355.00	355.21	100.06%							100.03%
11	榆绥高速公路交安设施 BZ-1 标	1189.57	1491.26		301.69								125.36%
12	西宁海东军分区民兵训练综合楼	870.00	869.59		44.59								99.95%
13	2011 年水毁治理工程 TJ-ZL-1 标段	158.25	206.45		49.25								130.46%
14	江苏省 322 省道庞庄桥维修工程	151.64	179.03		38.53								118.06%

集团公司2013年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第四季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
第三工程公司		151027.11	70520.65	42701.00	48178.34	112.83%	10388.95	15866.35	152.72%	3500.00	5082.67	145.22%	46.69%
1	青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标	21719.39	11279.54	7265.00	7268.33	100.05%	364.70	368.03	100.91%				51.93%
2	西宁南绕城公路土建工程 9 标	37800.00	28864.10	14492.00	16109.92	111.16%	3561.94	5179.86	145.42%	1400.00	1489.87	106.42%	76.36%
3	西宁南绕城公路土建工程 12 标	29000.00	22459.16	13118.00	15893.76	121.16%	2750.70	5526.46	200.91%	1600.00	1602.73	100.17%	77.45%
4	神渭管道输煤项目六(1)标段	2928.53	2990.36	2929.00	2990.36	102.09%	962.68	1024.04	106.37%	500.00	530.40	106.08%	102.11%
5	田峪河桥	341.20	341.20	341.00	341.20	100.06%							100.00%
6	西安 2013 年国省干线危桥改造工程 C 标	1174.02	435.87	444.00	435.87	98.17%	221.83	213.70	96.34%		59.11		37.13%
7	陕西交通 2013 年养护工程 QS-5 标	314.08	307.31	308.00	307.31	99.78%							97.84%
8	陕西交通 2013 年养护工程 QS-6 标		248.22	269.00	248.22	92.28%	139.21	118.43	85.07%		64.71		
8	陕西交通 2013 年养护工程 QS-7 标		568.44		568.44			568.44					
9	黄延高速公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标段	57749.89	3026.45	3000.00	3026.45	100.88%	2387.89	2414.34	101.11%	716.63	882.80	123.19%	5.24%
10	十堰至天水高速公路 ACD-27 标段	29744.99	34781.79	235.00	688.63	293.03%		453.05			453.05		116.93%
11	蓝田至周至哑柏公路 A6 标	7756.90	903.89	300.00	299.85	99.95%							11.65%
第四工程公司		125103.40	36375.46	30359.00	35743.35	117.74%	9343.14	13205.03	141.33%	5817.99	7402.99	127.24%	29.08%
1	西铜高速公路 TH-20 标	33,468.18	24098.93	18590.00	20838.36	112.09%	3704.84	5953.20	160.69%	1800.00	2033.41	112.97%	72.01%
2	蓝田至周至哑柏公路 A6 标	3604.00	3187.42	2362.00	3187.42	134.95%	906.41	1731.83	191.06%		517.43		88.44%
3	西咸新区北环线路基 LJ-1 标	4227.38	415.55	410.00	415.55	101.35%	346.55	352.10	101.60%	324.69	324.69	100.00%	
4	神木石窑大桥	538.81	578.93	578.00	578.93	100.16%	138.87	139.80	100.67%		139.80		107.45%
5	十天高速公路旬阳连接 AD-LD 标	19,447.00	5483.81	4213.00	5483.81	130.16%	2013.27	3284.08	163.12%	1500.00	1633.33	108.89%	
6	店塔立交 N1 标	9855.16											
7	西咸新区北环线路基 LJ-8 标	53962.87	2610.82	2600.00	2610.82	100.42%	1733.20	1744.02	100.62%	1928.30	1231.97	63.89%	
8	新接项目待定计划			500.00			500.00						
9	尾留产值			1106.00	2628.46	237.65%				265.00	1522.36		


集团公司 2013 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第四季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
10	神木至盘塘公路改扩建工程石窑村段路基 LJ1 标	5883.02	5515.41		-27.29								
11	十堰至天水高速公路 ACD-34 标段	27156.82	38393.71		265.50			265.50		265.00	265.50		141.38%
12	西铜公路陵前立交庄里连接线立交桥	20181.48	25498.51		2379.05			1256.86			1256.86		126.35%
13	西临高速公路灞桥收费站 ETC 建设配套工程	577.50	511.73		11.20								88.61%
陕西路桥路面工程有限公司		107407.29	79753.88	56822.00	61222.30	107.74%	10718.84	15124.33	141.10%	3225.00	5025.65	155.83%	74.25%
1	连云港徐圩新区港前大道工程建设	29047.27	26614.97	9725.00	10913.26	112.22%	2701.11	3889.37	143.99%	900.00	962.49	106.94%	91.63%
2	新海至徐圩新区 XX-2 标	15406.18	10888.89	7100.00	6902.28	97.22%	1149.76	952.04	82.80%	400.00	385.11	96.28%	70.68%
3	延志吴高速公路 LM-3 标段	12208.00	17135.78	11870.00	13617.90	114.73%	411.14	2159.04	525.13%		1745.67		140.37%
4	连云港其他项目	555.36	555.36	555.00	555.36	100.06%							100.00%
5	十天高速公路陕西汉略 HL-M04 标	9075.29	13788.03	12400.00	13788.03	111.19%	2228.83	3616.86	162.28%	1100.00	1157.15		151.93%
8	蒙靖 2013 年公路养护工程 DL-2 标	2937.73	4195.62	4196.00	4195.62	99.99%							142.82%
6	西长 2013 年公路养护工程 DL-4 标	1168.00	25.04	25.00	25.04	100.16%							2.14%
7	西镇 2013 年公路养护工程 DL-6 标	93.93	98.93	99.00	98.93	99.93%							105.32%
9	蓝商 2013 年公路养护工程 DL-8 标		753.97	754.00	753.97	100.00%							
10	西长拥抱养护工程				90.65			90.65			90.65		
11	渭蒲高速修补工程		488.84	344.00	488.84	142.10%		144.91			144.90		
12	西潼改扩建工程		808.61	616.00	808.61	131.27%		192.41			192.41		
13	西长养护工程				188.02			188.02			188.02		


集团公司 2013 年度施工项目计划执行情况

序号	项目名称	有效金额 (万元)	累计完成 施工产值 (万元)	年度产值(万元)			第四季度产值(万元)			月度施工产值(万元)			累计完 成合同 比率
				计划产值	实际完成	完成 比率	计划 产值	实际 完成	完成 比率	本月 计划	实际 完成	完成 比率	
14	咸旬高速公路路面 LM-1 标	21612.73	3626.43	3100.00	3626.43	116.98%	3100.00	3626.43	116.98%	700.00	684.96	97.85%	
15	西宝改扩建工程	15302.80	773.41	1128.00	773.41	68.56%	1128.00	773.41	68.56%	125.00	129.85	103.88%	
16	榆绥高速公路路面 LM-2 标段	27900.91	27414.74	156.45	303.19	193.79%		146.74					98.26%
17	十天高速公路安康东路面 AD-M03 标	23172.87	28369.93	655.10	655.10	100.00%							122.43%
18	十天高速公路安康西路面 M02 标	29335.97	30779.53	2086.99	1443.57	69.17%		-643.42			-643.43		104.92%
19	宝汉高速公路 LM1 标	26999.89	25784.27	1683.21	1683.21	100.00%							95.50%
20	西禹高速公路预防性养护工程 (XYF-04)	3691.38	2068.92	43.72	43.72	100.00%							
21	陕晋界收费站改扩建工程 WJTJ 标段	958.69	879.48	153.96	153.96	100.00%							91.74%
22	吴靖水毁治理工程 JT-ZL-5 标段	709.76	744.85	-12.67	-12.67	100.00%							104.94%
23	青银高速公路吴靖段 2012 年度路面病害 处治工程 WJLM-1 标段	1500.00	1648.09	475.97	475.97	100.00%							109.87%
24	吴靖 2012WJLM 标段	1167.73	1282.85	113.54	113.54	100.00%							109.86%
25	机场线小修 2012-2015 年度小修养护工 程	804.00	178.62	98.46	98.46	100.00%							22.22%
26	吴靖段路面车辙处治工程 LM-WJ-2 标	1956.17	1561.95	-382.10	-394.23	103.17%		-12.13			-12.13		79.85%
27	国道 312 咸阳至永寿段路面大修工程		8065.00	-2.95	-2.95	100.00%							
28	国道 2011 年 312 咸阳至永寿段路面大修 工程		47.17	47.17	47.17	100.00%							
29	商漫高速公路路面工程 LM3 标段	16237.79	15673.59	-212.09	-212.09	100.00%							96.53%
三、集团公司尾留项目				3274.00	3273.85								

2013年重点项目生产计划完成情况图表

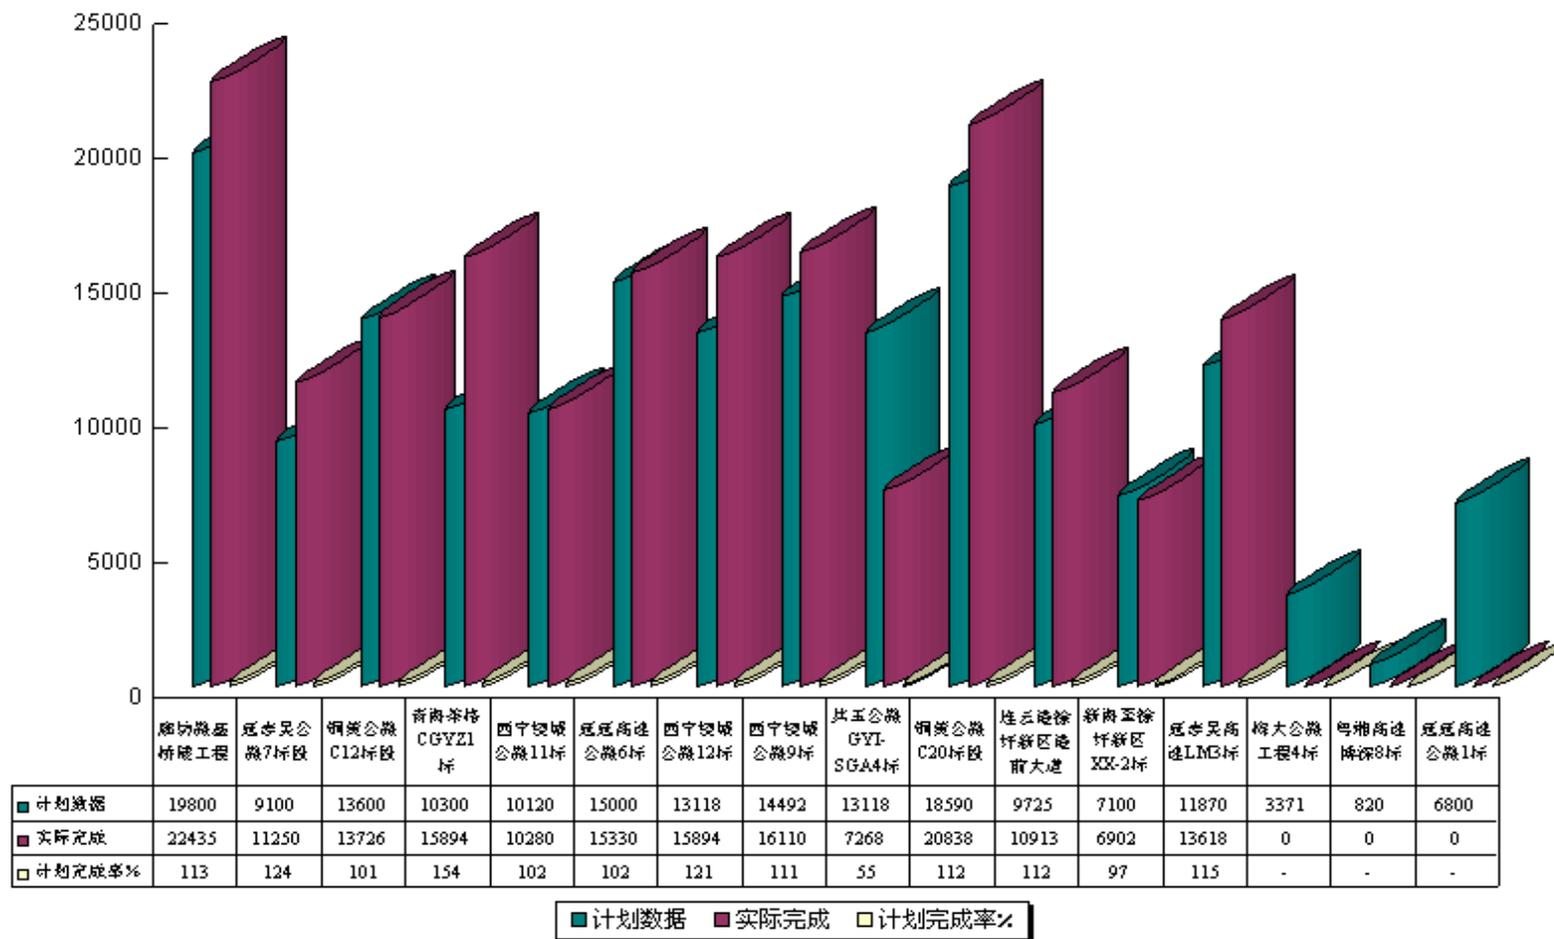

2013年重点项目合同履行统计图表

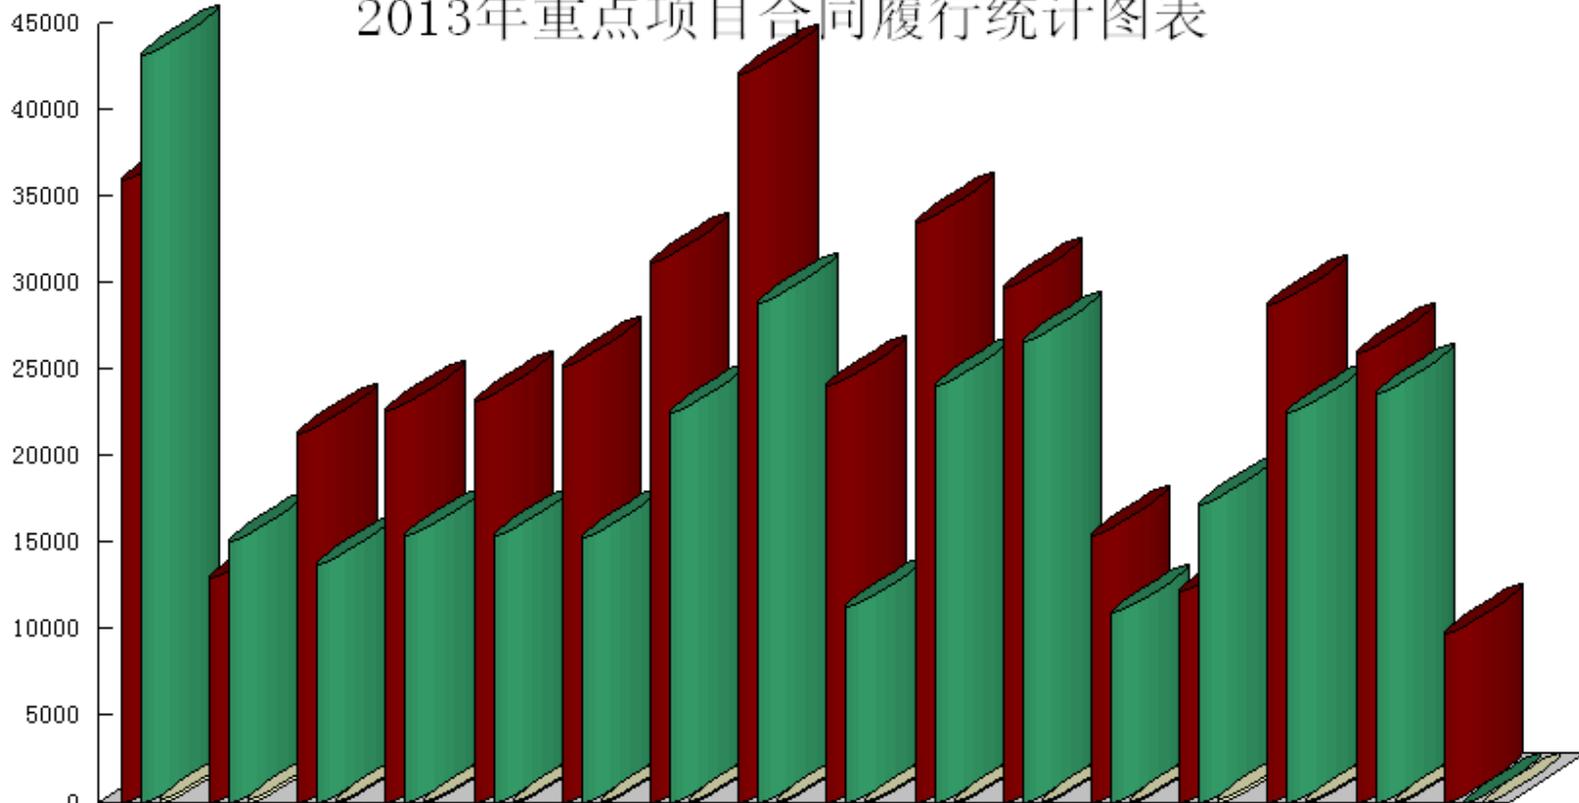

	柳坊梁基 桥隧工程	冠志昆公 路7标段	铜黄公路 C12标段	青商茶楼 CGYZ1标	西宁绕城 公路11标	冠志高速 公路6标	西宁绕城 公路12标	西宁绕城 公路9标	其五公路 GYL- SGA4标	铜黄公路 C20标段	桂云路徐 坪新区施 前大道	新商至徐 坪新区 XX-2标	冠志昆高 速LNG标	梅大公路 工程4标	包湘高速 博深8标	冠志高速 公路1标
■ 合同总额	35951	12974	21268	22641	23167	25162	31195	42089	24059	33468	29748	15406	12208	28748	25963	9736
■ 累计完成数量	43188	15027	13726	15338	15338	15330	22459	28864	11280	24099	26615	10889	17136	22468	23625	0
□ 计划完成率%	120	116	65	68	66	61	72	69	47	72	89	71	140	78	91	-

■ 合同总额 ■ 累计完成数量 □ 计划完成率%
